


Abancay, 07 de Marzo del 2014

INFORME N° 042-2014-R&S/Supervisión - Apurímac

Señor (a):
DIRECTORA (e) DEL PROGRAMA NACIONAL TAMBOS.
Esperanza Barreda Llaja.

Asunto : APROBACION DE VALORIZACION N° 03 DEL CONTRATISTA.

Referencia : SERVICIO DE SUPERVISION DEL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DEL SERVICIO DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CALCAUSO - JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC.

Contratista	: CONSORCIO CENTRAL
Modalidad de ejecución	: Contrato N° 004-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR.
Componente	: Ejecución de Obra e Implementación.
Plazo contractual	: 90 días calendarios
Inicio plazo Contractual	: 04 de Noviembre 2013.
Culminación real de obra	: 03 de Febrero 2014.
Supervisión	: R & S Consultoría y Construcción S.R.L.
Modalidad de ejecución	: Contrato 128-2013-VIVIENDA-OGA-UE.001.
Supervisor de obra	: ING. YASSER VLADIMIRO LAURA MAMANI CIP N° 81871.

1.- ANTECEDENTES.-

- 2). Cronograma valorizado actualizado
- 3). Valorización 03 del contratista.

2.- ANALISIS.-

Que de acuerdo al cronograma valorizado de obra vigente, se tiene las partidas ejecutadas que se detallan en la valorización de obra N° 03.

Dichas partidas ejecutadas han sido verificadas y aprobadas por la supervisión de obra, por lo tanto la jefatura de supervisión aprobó la valorización correspondiente al mes de Enero denominado valorización de obra N° 03.


3.- CONCLUSIONES.-

La supervisión de obra realizada el análisis correspondiente, **APRUEBA LA VALORIZACION DE OBRA N° 03 DEL CONTRATISTA CUANTIFICANCO EL 40.15% DEL AVANCE FISICO mensual equivalente a S/ 177,414.19**, recomendando a la entidad se haga el pago correspondiente, según contrato.

Esperando su Atención y Comprensión.

Me suscribo

Adjunto:
02 ejemplares.


 Ing. Alfredo KANA
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 30



RUC N° 20447700248

R.C. N° C13564

Abancay, 07 de julio del 2014.

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSERVACION Y SANEAMIENTO
 Unidad de Trámite Documentario

68037 f

CARTA N° 099-2014-R&S/Supervisión - Apurímac

Señor:
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL TAMBOS.
WALTER L. GUILLEN ROJAS.

Asunto : COMUNICO CULMINACION DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO.

Referencia : SERVICIO DE SUPERVISION DEL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DEL SERVICIO DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CALCAUSO - JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC.

Contratista : CONSORCIO CENTRAL
 Modalidad de ejecución : Contrato N° 004-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR.
 Componente : Ejecución de Obra e Implementación.
 Plazo contractual : 90 días calendarios
 Inicio plazo Contractual : 04 de noviembre 2013
 Ampliación de plazo : 19 días calendarios
 Culminación real de obra : 05 de febrero 2014.
 Culminación real de implementación : 30 de junio del 2014.

Supervisión : R & S Consultoría y Construcción S.R.L.
 Modalidad de ejecución : Contrato 128-2013-VIVIENDA-OGA-UE.001.
 Supervisor de obra : ING. YASSER VLADIMIRO LAURA MAMANI CIP N° 81871.

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle la culminación total del componente implementación de la obra de la referencia, en fecha 30 de junio del presente, es más reitero que el componente infraestructura se culminó en fecha 05 de febrero del presente, para lo cual recomiendo a la entidad la conformación del comité de recepción de obra dentro de los plazos indicados en la LyRCE.

Esperando su Atención y Comprensión.

Me suscribo

Adjunto:
Copia de cuaderno de obra.

R&S cc. CEL

 Alfredo Romero Kana
 GERENTE GENERAL


CUADERNO DE LA OBRA: CONSTRUCCION TOMBO C.P. CALCAUSO

Propietario: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Dirección: C.P. CALCAUSO J. ESPINOSA M. ANTIOQUIA - P. PURULLA

Contratista: CONSORCIO CENTROS.

FECHA

30/06/77	ASIENTO N° 81
	DEL SUPERVISOR.
	LA SUPERVISION VERIFICA IN SITU QUE EL COMPONENTE
	IMPLEMENTACION SE HA CUMPLIDO AL 100%; POR LO TANTO SE
	COMUNICA A LA ENTIDAD PARA LA CONFORMACION DEL
	COMITE DE RECEPCION DE OBRA.
	
	<p>Yasser Vladimir Laura Maniani INGENIERO CIVIL C.T. 81881</p>





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Hoja de Trámite
00120553-2014
EXTERNO

Remitente : R&S CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.C.R.L.
Destinatario : PNT - PROGRAMA NACIONAL TAMBOS
Documento : 145-2014-R&S/SUEPRVISION - APURIMAC Folios : 36
Asunto : REMITE INFORME FINAL DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SERVICIO DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CALCAUSO-JUAN ESPINOZA MEDRANO-APURIMAC
Fecha : 16/12/2014 04:38:52 p.m.
Observaciones :

Snip:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

Destino	Acciones	Fecha	Responsable	Firma	Observaciones
U.I	1	17/12/14			18 DIC. 2014 RECEBIDO Firma: Hora:
INB-FBLY V. A. CIVIL	10/21	18 DIC. 2014			

- 1 Conocimiento y Fines
- 2 Tramitar
- 3 Devolver
- 4 Revisar o VºBº
- 5 Coordinar
- 6 Urgente
- 7 Pendiente
- 8 Respuesta
- 9 Archivo
- 10 Evaluar
- 11 Preparar Respuesta
- 12 Opinión
- 13 Corregir
- 14 Proceder de acuerdo a normas legales vigentes
- 15 Otros


Abancay, 15 de diciembre del 2014.

CARTA N° 145-2014-R&S/Supervisión - Apurímac

Señor:
DIRECTOR DEL PROGRAMA NACIONAL TAMBOS.
WALTER L. GUILLEN ROJAS.

Asunto : INFORME FINAL DE SUPERVISION.

Referencia : SERVICIO DE SUPERVISION DEL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. EJECUCION DE OBRA. EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DEL SERVICIO DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CALCAUSO - JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC.



Contratista : CONSORCIO CENTRAL
Modalidad de ejecución : Contrato N° 004-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR.
Componente : Ejecución de Obra e Implementación.
Plazo contractual : 90 días calendarios
Inicio plazo Contractual : 04 de noviembre 2013.
Ampliación de plazo : 19 días calendario.
Culminación real de obra : 05 de febrero 2014.
Culminación de obra + implem. : 30 de junio del 2014.

Supervisión : R & S Consultoría y Construcción S.R.L.
Modalidad de ejecución : Contrato 128-2013-VIVIENDA -OGA- UE.001.
Supervisor de obra : ING. YASSER VLADIMIRO LAURA MAMANI CIP N° 81871.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el INFORME FINAL DE SUPERVISION, en razón de que la presente obra se encuentra CULMINADA Y RECEPCIONADA por el comité de recepción, indicamos la siguiente documentación:

- 1) CD de fotos
- 2) Informe final de supervisión.
- 3) Resumen de valorización.
- 4) Valorización final de obra
- 5) Copias de cuaderno de obra
- 6) Panel fotográfico
- 7) Documentación remitida a la entidad
- 8) Acta de recepción de obra y acta de custodia de implementación.

Al mismo le solicito el pago del 20% por entrega del informe final según contrato.

Esperando su Atención y Comprensión.

Me suscribo

Adjunto: Factura N°

R&S C.C. - S.C.R.L.
[Signature]
Ing. Alfredo Romero Kana
GERENTE GENERAL
DNI N° 01333200


R&S Consultoría y Construcción S.C.R.L.

Av. Cancharani N° 304

Urb. Ricardo Palma

Cel. 9683082 - 9771075

PUNO - PERÚ



RUC. 20447700248

FACTURA

001- N° 000092

Señores/Ministero de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Dirección: Av. Paseo de la Republica N° 3361 San Isidro

"Operación sujeta al Spot"

Guía de Remisión:

RUC. 20501113307.

Fecha, 07 de Abril del año 2015.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNITE	IMPORTE
	4º Pago a la Compañía de la 3ª Valorización e		5,857.80
	Informe final de obra de la Supervisión del Con		
	trato Llave en Mano, Para la Elaboración de Expedien		
	te Técnico, Ejecución de la obra, Equipamiento e Imple-		
	mentación de los Centros de Servicios de Apoyo a/Ha		
	bitat Rural C.P. Calcauso, Juan Espinoza Medrano, Anta		
	bamba Apurimac. 20% Sg. Contrato N° 128-2013 -		
	Vivienda - OGA - UE 001. Detracción: Cia. N° 00-021-02316 Bco. Nación		

SON: Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Seis 09 /100 Nuevos Soles.

IMPRESIONES GRAFICAS AGUARELA
 Dr. Susana La Torre Muñoz
 RUC. 10293905407
 Jr. Cusco N° 118 - JULIACA
 Aut. N° 018533213 Fl. 26 - 10 - 2006
 Serie: 001 del 001 al 100

SUB TOTAL	4,964.24
I.G.V. (18%)	893.56
TOTAL S/.	5,857.80

USUARIO

CANCELADO

	PROGRAMA DE APOYO AL HABITAT RURAL	
	INFORME MENSUAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	

INFORME FINAL

Mes de diciembre del 2014

1. **FECHA:** 15 de diciembre del 2014.


2. **RESUMEN EJECUTIVO:**

Obra	CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL
Nombre	"CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT DEL CENTRO POBLADO CALCAUSO DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO PROVINCIA DE ANTABAMBA – DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
Ubicación	CENTRO POBLADO: CALCAUSO DISTRITO: JUAN ESPINOZA MEDRANO PROVINCIA: ANTABAMBA DEPARTAMENTO: APURIMAC
Contratista	CONSORCIO CENTRAL Residente de Obra: Ing. Francisco Yafac Velasquez - CIP N° 34494
Supervisor de Obra	Consultora: R&S C.C. SCRL Jefe de la Supervisión: Ing. Yasser V. Laura Mamani CIP N° 81871
Coordinador de Obra	Ing. Oscar Erik Cemizo Mejia - CIP N° 137990
Contrato	Contrato N°004-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR del 2013
Monto de Contrato (Inversión)	Expediente técnico : S/. 19,872.69 (inc. IGV) Ejecución de obra : S/. 441,862.20 (inc. IGV) Moviliario : S/. 53,956.11 (inc. IGV)
Monto de Contrato (Considera Adicionales y/o Deductivos)	515,691.00
Financiamiento	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Población Beneficiada	2200 Habitantes.
N° de Lotes	400 Lotes.
F. Inicio	04 de Noviembre del 2013
Plazo de Ejecución	75 días calendarios.
Ampliaciones de Plazo	• 19 días Ampliación N° 042 – Resolución N° 042-2014-PNT •
F. Término Contractual	17 de Enero del 2014
Adicionales de Obra	No hay
Objetivo de la Obra	• Permitir que los pobladores de las zonas más alejadas tengan un contacto más directo con los servicios

R&S C.C. SCRL.
[Firma]
Ing. Alfredo Romero Kana
GERENTE GENERAL
RNI N° 01333200

	PROGRAMA DE APOYO AL HABITAT RURAL	
	INFORME MENSUAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	

	<p>públicos y atención que brindará el Ministerio de Vivienda y Saneamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de la población asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa.
Descripción de la Obra	<ul style="list-style-type: none"> • Arquitectura. Se contempla la construcción de 3 módulos multiusos de un solo nivel los cuales presenta los ambientes de: MODULO 01: Dos dormitorios, servicios higiénicos, un hall y un deposito. MODULO 02: Salón de usos múltiples. MODULO 03: Área administrativa, tópico con un baño, cocina y despensa. • Estructura. Los elementos estructurales serán de concreto armado, considerándose como resistencia del concreto $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ para todos los elementos estructurales que llevan fierros, a excepción de los dinteles y mesas de repostería, donde se ha considerado una resistencia del concreto $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$. • Instalaciones Sanitarias. Las instalaciones sanitarias de agua y desagüe serán empotradas de acuerdo a las indicaciones contempladas en los planos respectivos. • Instalaciones Eléctricas. Las instalaciones eléctricas serán ejecutadas teniendo como base los planos de la especialidad.
Avance Acumulado de Obra	<p>Programado: 100.00% Ejecutado : 100.00% Situación : CONCLUIDA.</p>
Conclusiones y/o Recomendaciones	<p>1. La presente obra se encuentra en un avance físico del 100% del avance programado en lo que respecta a ejecución de obra, estando en la condición de concluido.</p>


R&S S.C. - SCS
 Ing. Alfredo Romero Kana
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 01333200

	PROGRAMA DE APOYO AL HABITAT RURAL	
	INFORME MENSUAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	

3. FICHA TECNICA:

1 Obra:

CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT DEL CENTRO POBLADO CALCAUSO DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO PROVINCIA DE ANTABAMBA – DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2 Descripción:

Se contempla la construcción de 3 módulos multiusos de un solo nivel los cuales presenta los ambientes de: MODULO 01: Dos dormitorios, servicios higiénicos, un hall y un deposito. MODULO 02: Salón de usos múltiples. MODULO 03: Área administrativa, tópico con un baño, cocina y despensa.


3 Ubicación:

- Centro Poblado : Calcauso.
- Distrito : Juan Espinoza Medrano.
- Provincia : Antabamba.
- Departamento : Apurimac.
- Zona : Rural.
- Región Natural : Sierra.
- Altitud : 3,516 m.s.n.m.

4 Contratista:

- Dirección Legal Contratista:
Av. Arenales Nº 2632 Oficina Nº 9B-1 Distrito de Lince – Provincia y Departamento de Lima.
- Teléfono del Contratista:
- Fax :
- Mail del Contratista : consultoresejecutores@gmail.com
- Representante Legal Contratista :
Ing. Segundo German Juarez Purizaca - DNI: 05644259

5	Fecha de Convocatoria	: 02 de Mayo del 2013
6	Fecha de Buena Pro	: 19 de Junio de 2013.
7	Fecha firma del Contrato	: 15 de Julio de 2013.
8	Valor Referencial	: 41,974,979.60
9	Fecha Valor Referencial	: 02 de Mayo del 2013
10	Monto del Contrato	: 515,691.00
11	Factor de Relación	: 1
12	Plazo Ejecución Referencial	: 75 días calendario
13	Plazo Ejecución Contractual	: 75 días calendario
14	Fecha de entrega del terreno	: 18 DE JULIO DEL 2013
15	Fecha de solicitud adelanto directo	: no corresponde
16	Fecha Recep. fianza Adel. Directo	: no corresponde
17	Fecha de pago Adelanto directo	: no corresponde
18	Fecha de Inicio de obra	: 04 de Noviembre del 2013.

R&S C. O. S. C. R. L.

 Ing. Alfredo Romero Kana
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 01333200

PROGRAMA DE APOYO AL HABITAT RURAL
INFORME MENSUAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS

- 19 Fecha de Término de obra : 17 de Enero del 2014
 20 Adicionales de Obra : no corresponde
 21 Ampliaciones de plazo : Ampliacion de plazo N°01- 19 dias calendarios.
 22 Nueva fecha Término Contractual : 05 de Febrero del 2014.
 23 Sistema de Contratación : suma alzada
 24 Financiamiento : MINISTERIO DE VIVIENDA
- 25 Supervisor:
 • Dirección Legal Supervisor :
 Calle Manuel Clavero N° 2072, 4to piso, distrito de San Martin de Porres, Provincia y Departamento de Lima.
- Teléfono del Supervisor : - Fax :
 • Mail del Supervisor : al.ro.ka@hotmail.com
 • Representante Legal Supervisor : Ing. Alfredo Romero Kana - DNI : 01333200
- 26 Fecha firma Contrato de la Supervisión : 05 de Setiembre de 2013.
 27 Fecha de Inicio de Supervisión : 04 de Noviembre de 2013.
 28 Fecha de Termino Contractual Supervis. : 08 de Marzo de 2013.

4. DATOS IMPORTANTES:

<u>CARGO</u>	<u>Nombres y Apellidos</u>	<u>COLEGIATURA (CIP)</u>	<u>Teléfono</u>
Proyectista	CONSORCIO CENTRAL		
Residente Obras Generales	FRANCISCO YAFAC GONZALES	34494	
Residente Obras Secundarias			
Residente Intervención Social			
Jefe de Supervisión			
Supervisor Obras Generales	YASSER VLADIMIRO LAURA MAMANI	81781	
Supervisor Obras Secundarias			
Supervisor Intervención Social			

5. ADELANTOS OTORGADOS:

<u>ADELANTOS</u>	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>MONTO S/.</u>	<u>AMORTIZ. S/.</u>	<u>SALDO S/.</u>
Directo					
Mat. N°					

6. CARTAS FIANZA:

<u>N°</u>	<u>FIANZA N°</u>	<u>AFIANZADOR</u>	<u>GARANTIZA</u>	<u>MONTO S/.</u>	<u>FECHA EXPED.</u>	<u>FECHA VENCIM.</u>	<u>OBSERV.</u>

(* La Fianza quedará liberada de toda responsabilidad si no se exige el cumplimiento de la obligación quince (15) días después de su vencimiento (Art. 1898 del Código Civil)

R&S C.C. S.R.L.

 Ing. Alfredo Romero Kana
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 01333200

	PROGRAMA DE APOYO AL HABITAT RURAL	
	INFORME MENSUAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	

7. ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS:

- La obra concluyo en el me de febrero del 2014
- La implementación concluyo en el me junio del 2014.
- La recepción de obra se realizó en el mes de diciembre del 2014.

8. AVANCES FISICOS:

- Descripción del Avance Físico de cada Fórmula Polinómica

Nº	DESCRIPCION	% Avance del Mes	% Avance Acumulado
1	Fórmula Polinómica N° 01	2.34	100.00
3		

9. AVANCE ECONOMICO:

- Descripción del Avance Económico Total de la Obra

Nº	DESCRIPCION	% Avance del Mes	% Avance Acumulado	Situación (Adel. / Atraso)
1	Avance Programado	2.34%	100.00%	CONCLUIDO
2	Avance Ejecutado	2.34%	100.00%	

10. ADICIONALES / DEDUCTIVOS / MAYORES GASTOS GENERALES:

Nº	% INCID.	% INCID. ACUM.	MONTO	RESOLUCION N° / FECHA.	OBSERVACION

11. AMPLIACIONES DE PLAZO:

Nº	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL	Días Naturales	NUEVA FECHA DE TERMINO	RESOLUCION N° / FECHA	OBSERVACION
01	17/01/2014	19	05/02/2014	RESOL. N°042-2014-PNT FECHA: 05 Febrero del 2014	

12. PERSONAL DEL CONTRATISTA:

- Residente de Obra : FRANCISCO YAFAC VELASQUEZ
- Asistente de Obra :
- Maestro de Obra :
- Operarios : 06
- Oficiales : 02
- Peones : 10

13. EQUIPOS DEL CONTRATISTA:

- Relación de Equipos utilizados por el Contratista

R&S C.C. - S.R.L.

 Ing. Alfredo Romero Kana
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 01333200

	PROGRAMA DE APOYO AL HABITAT RURAL	
	INFORME MENSUAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	

MEZCLADORA DE 11 P3
 PLANCHA COMPACTADORA DE 7HP
 VIBRADORA DE 4HP

14. PERSONAL DEL SUPERVISOR:

- Personal de la Supervisión que han participado en la semana

CARGO DE SUPERVISION QUE DESEMPEÑA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe de Supervisión	YASSER V. LAURA MAMANI	
Ing. Asistente		
Topógrafo		

15. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DEL SUPERVISOR:

- Relación de Actividades que cada uno del Personal de la Supervisión ha desarrollado en el mes.

LA SUPERVISION DE OBRA HA REALIZADO LAS ACCIONES DE CONTROL DEL AVANCE FISICO CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

CONTROL DEL CUPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

CONTROL ECONOMICO DE OBRA

CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES.

16. EQUIPOS DE LA SUPERVISION:

- Relación de Equipos usados por la Supervisión para el control de la obra durante el mes.

CAMIONETA HI LUX

17. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

17.1. Estado de la Obra.- Referirse a las Actividades indicadas en el diagrama GANTT, indicando su estado (atrasada o adelantada), si estuvieran atrasadas indicar las causas, y que se recomienda para su corrección.

- LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN CUANTO A LA EJECUCION DE OBRA.


17.2. Conflictos Laborales.

- NO SE PRESENTARON CONFLICTOS LABORALES

17.3. Problemas pendientes (Adicionales de obra, Ampliaciones de Plazo, Consultas sobre ocurrencias en la obra)

- NO EXISTE PROBLEMAS, SE COORDINA CON EL CONTRATISTA PARA EVITAR PROBLEMAS

17.4. Conclusiones

R&S C.C. SRL

 Ing. Alfredo Romero Kana
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 01333200

	PROGRAMA DE APOYO AL HABITAT RURAL	
	INFORME MENSUAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	

- LA OBRA SE EJECUTÓ EN FORMA NORMAL TENIENDO SIEMPRE EN CUENTA LA LEJANIA DE LAS MISMAS RESPECTO A LA CAPITAL DE PROVINCIA.

18. CONTROL GRAFICO DE AVANCE DE OBRA:

18.1. Curva "S" de avance de obra mensual

SE ADJUNTA EN LOS ANEXOS

19. CONTROL DE CALIDAD:

a) **Pruebas de campo:** Detallar los controles de campo efectuados en el mes, como pruebas hidráulicas, control de compactación.

SE HA EFECTUADO LOS CONTROLES DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN INSTALACIONES DE AGUA.

b) **Control de calidad de materiales:** Detallar los certificados/protocolos/informes de conformidad de los materiales durante el mes, incluyendo los controles de la resistencia a la compresión del concreto.

PARA ESTA ETAPA DE EJCUCION DE OBRA SOLO SE TIENE LOS TESTIGOS DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA SER CONTROLADOS EN LABORATORIO.

20. CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA:

Reportar el cumplimiento de la especificación "Seguridad e Higiene Ocupacional en la Construcción de las Obras ejecutadas por MVCS

EL CONTRATISTA ESTA CUMPLIENDO CON LA SEGURIDAD E HIGUIENE EN OBRA.

21. ANEXOS:

- Hoja Resumen de Valorización
- Copias del Cuaderno de Obras
- Panel Fotográfico
- Otros



 Yasser Vladimir Laura Mamani
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 81871

Ing.
Jefe de la Supervisión

R&S C.C. SCRL


 Ing. Alfredo Romero Kana
 GERENTE GENERAL
 D.N.I. N° 0137262

Curva de Control "S"

10



"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO HABITAT RURAL DEL C.P. DE CALCAUSO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA"

EJECUTA: CONSORCIO CENTRAL
PRESU S/. 441,862.21

SUPERVISOR: : ING. YASSER VLADIMIRO LAURA MAMANI

DESCRIPCION		AVANCE MENSUAL S/.			AVANCE MENSUAL ACUMULADO S/.			SALDO S/.	
Nº	Mes	Programado Físico	Ejecutado Físico	Financiero Ejecutado	Programado Físico	Ejecutado Físico	Financiero Ejecutado	Ejecutado Físico	Financiero Ejecutado
1	INICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	nov-13	128,579.37	128,579.37	128,579.37	128,579.37	128,579.37	0.00	128,579.37	0.00
3	dic-13	154,298.28	154,298.28	154,298.28	282,877.65	282,877.65	0.00	282,877.65	0.00
4	ene-14	148,636.16	148,636.16	148,636.16	431,513.81	431,513.81	0.00	431,513.81	0.00
5	feb-14	10,348.40	10,348.40	10,348.40	441,862.21	441,862.21	0.00	441,862.21	0.00
TOTAL		441,862.21							

DESCRIPCION		% AVANCE MENSUAL			% AVANCE MENSUAL ACUMULADO			SALDO S/.	
Nº	Mes	Programado Físico	Ejecutado Físico	Financiero Ejecutado	Programado Físico	Ejecutado Físico	Financiero Ejecutado	Ejecutado Físico	Financiero Ejecutado
1	INICIO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	nov-13	29.10%	29.10%	29.10%	29.10%	29.10%	0.00%	29.10%	0.00%
3	dic-13	34.92%	34.92%	34.92%	64.02%	64.02%	0.00%	64.02%	0.00%
4	ene-14	33.64%	33.64%	33.64%	97.66%	97.66%	0.00%	97.66%	0.00%
5	feb-14	2.34%	2.34%	2.34%	100.00%	100.00%		100.00%	
		100.00%							

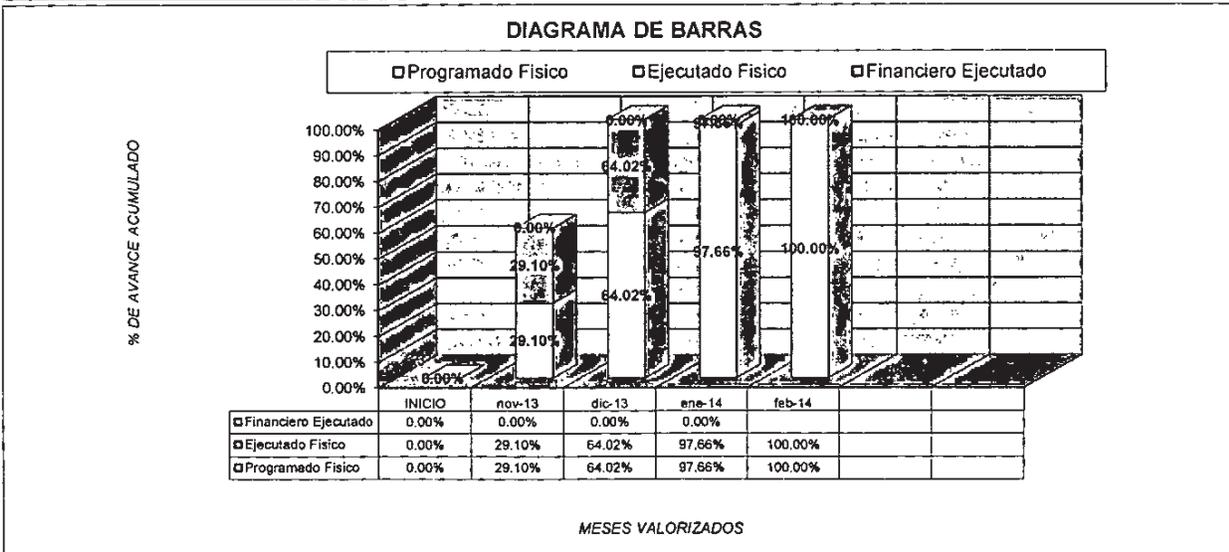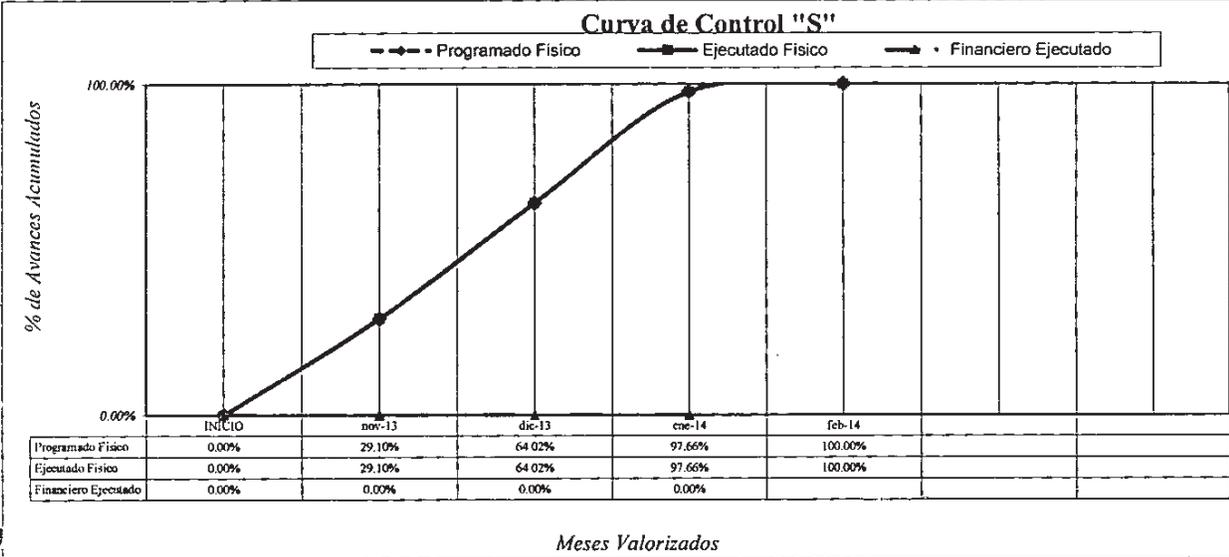

R&S C.C. S.C.R.L.

 Ing. Alfredo Romero Kane
 GERENTE GENERAL
